



Visma L7 & LTR
Koulutuspäivä 2024



Visma LTR

Projektiseuranta ja -budjetointi

23.5.2024 Satu Raimesalo, Visma Sirius Oy



Visma L7 & LTR
Koulutuspäivä 2024



Työpajan agenda

Projektivalvonta ja -budjetointi Visma L7

LTR ratkaisun esittely

Projektin vaiheet ERP:ssä



Projektin vaiheet ERP:ssä



Visma L7/LTR Projektin elinkaari

Projektin avaus

L7: Työnumeroiden ja mahdollisten litterarakenteiden luominen.

Projektiseuranta

Etenemän, toteumien sekä mahdollisten tarkastus- ja riskikohtien valvonta.

Projektin päättäminen

Päättämisen toimenpiteet, mahdollisen osatuloutuksen purut ja tuloutus, projektin tulokset ja yhteenveto.

Projektibudjetointi

Budjetointi leikepöydän avulla tai manuaalisesti.

Ennusteiden päivitys

Mikäli osatuloutus käytössä, ennusteiden siirto myös L7-järjestelmän käyttöön.

Avoimet maksuerät
Ennusteet Projektin tila
Ainekäyttö Osatuloutus
Yleiskustannukset Myyntitilaukset
Resurssit Kirjanpito tapahtumat
Muutosten hallinta Liikevaihto
Riskivaraukset Suunnittelutyö KET
Aliurakat Rahoitustuotot Valmiusaste
Kate Budjetti Lisätyöt
Litterat Kannattavuus Poikkeamat

L7 Nykytila

BUDJETTI: TILIRYHMÄ

Yhteinen budjetti - esittämä

Työn alkua: Työn alku Koko alku Koko väliaika

Kaikki alu: Kaikki alu Kaikki väliaika

Kaikki: Kaikki Kaikki Kaikki

15.11.2022 12:00

Nimi	Budjetit	laskutettu	suorite (loma)
300 LÖNKEVÄSTÖ	14000,00		14000,00
310 ERÄKOOLASUKUTUS			
400 ANKASTIET	4000,00		4000,00
405 PALKAT JA SOSIAALIMUUT	100,00		100,00
410 MA.TUK. JA PÄÄVÄRAVAT			
415 ALIBUUT	500,00		500,00
500 PROJEKTIKUSTO	2000,00		2000,00
505 MA.TUK. JA PÄÄVÄRAVAT (K)			
600 KANSTOJOKUTUS			
902 PROJEKTIN KULUT YHTIEISÄ	42000,00		42000,00
903 ** KATEY. MK	-42000,00		-42000,00
904 ** KATEY. %			
910 YLEISKUSTANNUKSET	4200,00		4200,00
915 ** KATEY. MK	-46000,00		-46000,00
916 ** KATEY. %			

BUDJETTI: LITTERA

Yhteinen budjetti

Työn alkua: Työn alku Koko alku Koko väliaika

Kaikki alu: Kaikki alu Kaikki väliaika

Kaikki: Kaikki Kaikki Kaikki

15.11.2022 12:00

Nimi	Budjetit	laskutettu	suorite (loma)
300 LÖNKEVÄSTÖ	14000,00		14000,00
310 ERÄKOOLASUKUTUS			
400 ANKASTIET	4000,00		4000,00
405 PALKAT JA SOSIAALIMUUT	100,00		100,00
410 MA.TUK. JA PÄÄVÄRAVAT			
415 ALIBUUT	500,00		500,00
500 PROJEKTIKUSTO	2000,00		2000,00
505 MA.TUK. JA PÄÄVÄRAVAT (K)			
600 KANSTOJOKUTUS			
902 PROJEKTIN KULUT YHTIEISÄ	42000,00		42000,00
903 ** KATEY. MK	-42000,00		-42000,00
904 ** KATEY. %			
910 YLEISKUSTANNUKSET	4200,00		4200,00
915 ** KATEY. MK	-46000,00		-46000,00
916 ** KATEY. %			

RAPORTIT

Välite tuloslaskelma - raportit

Raportit

Valitse van alueeseen käytössä olevat raportit

Valinta	Yksikkö	Yksikkö	Käyttö	Tuotantoryhmä	Kat	Tekninen
<input type="checkbox"/>	Suoritus (Suoritus)		<input type="checkbox"/>	1	Raportit	Paanu1
<input type="checkbox"/>	Suoritus (Suoritus)		<input type="checkbox"/>	1	Raportit	Paanu2
<input type="checkbox"/>	Suoritus (Suoritus)		<input type="checkbox"/>	1	Raportit	Paanu3
<input type="checkbox"/>	Suoritus (Suoritus)		<input type="checkbox"/>	1	Raportit	Paanu4
<input type="checkbox"/>	Suoritus (Suoritus)		<input type="checkbox"/>	1	Raportit	Paanu5

Välite tuloslaskelma - raportit


Valitse van alueeseen käytössä olevat raportit

Valinta	Yksikkö	Yksikkö	Käyttö	Tuotantoryhmä	Kat	Tekninen
<input type="checkbox"/>	Suoritus (Suoritus)		<input type="checkbox"/>	1	Raportit	Paanu1
<input type="checkbox"/>	Suoritus (Suoritus)		<input type="checkbox"/>	1	Raportit	Paanu2
<input type="checkbox"/>	Suoritus (Suoritus)		<input type="checkbox"/>	1	Raportit	Paanu3
<input type="checkbox"/>	Suoritus (Suoritus)		<input type="checkbox"/>	1	Raportit	Paanu4
<input type="checkbox"/>	Suoritus (Suoritus)		<input type="checkbox"/>	1	Raportit	Paanu5


*useita seurantaan tarvittavia sovelluksia

LTR Projektiseuranta ja -budjetointi


- LTR projektiseuranta ja budjetointi -sovellus perustuu LTR DWH (Data Warehouse) ratkaisuun
- DWH sisältää Visma L7:n toteumatiedot jalostetussa muodossa siten että tietojen haku on nopea
- Voi sisältää myös muita tietoa (esim. toimittamattomat maksuerät)
- Tiedot päivittyvät DWH:lle:
 - LTR:n data reaaliajassa
 - L7:n data kerran vuorokaudessa

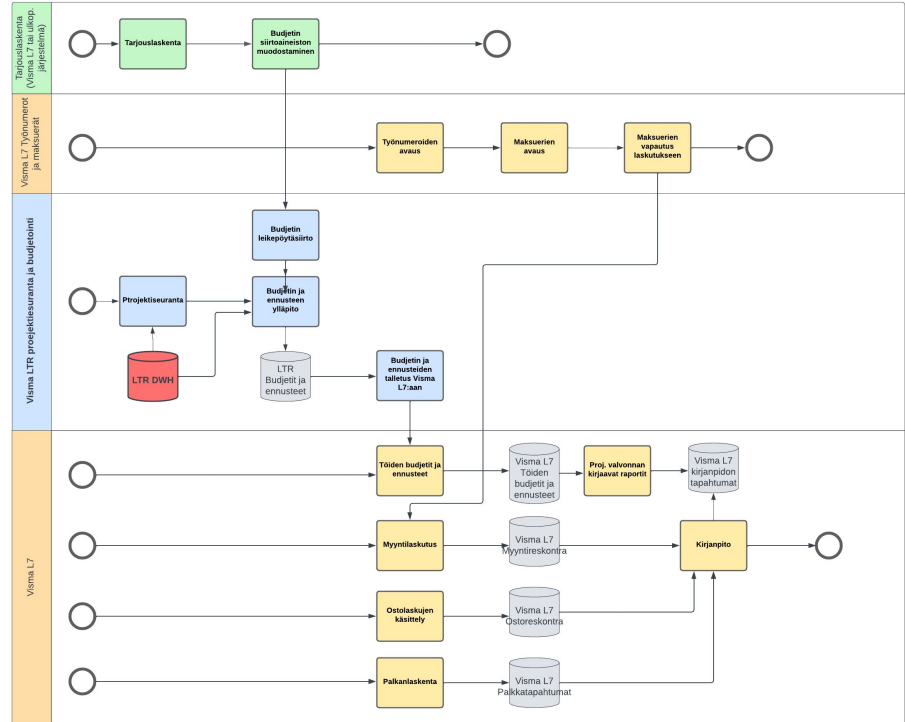

LTR Projektiseuranta ja -budjetointi

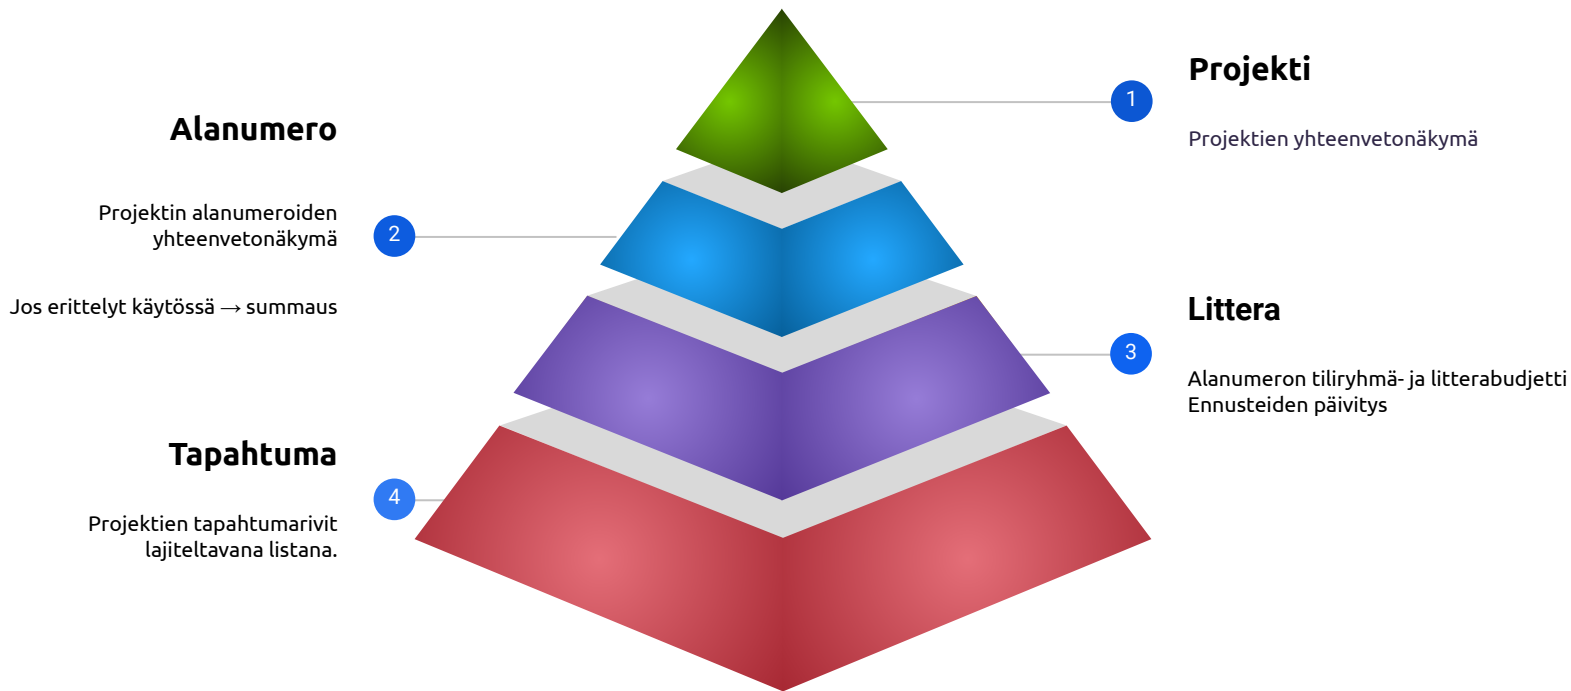

Sovelluksen rakenne

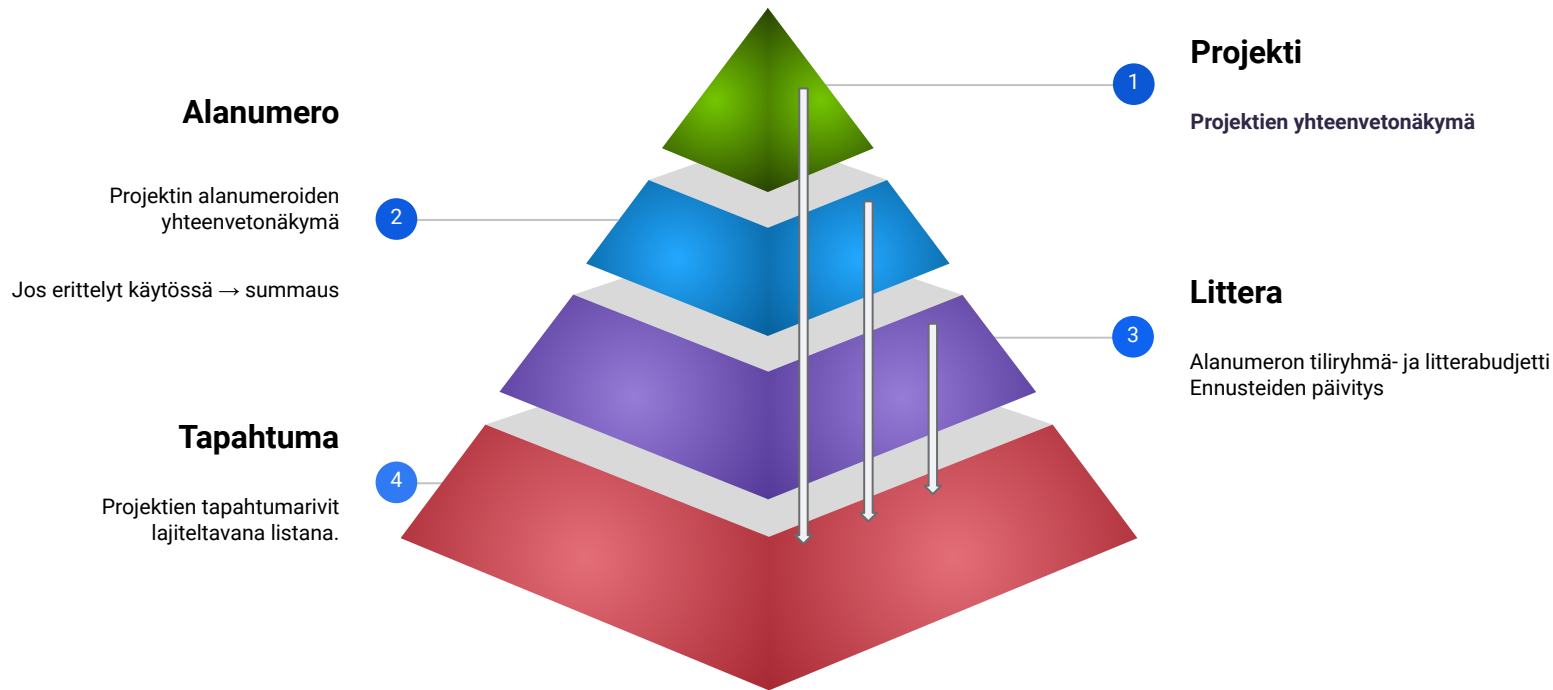

Porautuminen eri tasoille, aina tapahtumaan asti

Projektit Alanimerot Litterat Tapahtumat Asetukset

admin - Pääkäyttäjä

Projektit 1-4/4 Kausi (vwwkk) 202311 Näkymä Oletusnäkyä +

Suosikki	Pääno	Pääno Selite	Kustpk	Liikevaihto	Ainekäyttö	Palkat	Kulut Yht.	Kate Eur	Kate %
<input type="checkbox"/>	TARVIK	TARVIKEMYYNTI	0022	3 787,36	-67,59	0,00	-67,59	3 854,95	101,8
<input type="checkbox"/>	150184	SISÄINEN	0022	57,00	70,68	0,00	70,68	-13,68	-24,0
<input type="checkbox"/>	999140	LTR-testiprojekti 1	0022	60 000,00	887,10	317,00	1 204,10	58 795,90	98,0
<input type="checkbox"/>	999141	LTR-testiprojekti 2	0022	0,00	1 854,84	264,00	2 118,84	-2 118,84	

Lisää suosikkeihin Poista suosikeista Päivitä valittujen budjetit L:ään

Visma Real Estate Oy / 9.10.2023 11:40 / Avoin Oy / Pääkäyttäjä / 1008 ms

Sovelluksen rakenne

Projektit Alanimerot Litterat Tapahtumat Asetukset

admin - Pääkäyttäjä

Alanimerot 1-2/2 Kausi (vwwkk) 202311 Näkymä Oletusnäkyä +

Laajuus Yhteensä (alanro + erittelytyyri)

Työn tyyppi Urakatyöt Laskutyöt Investoinnit
 Sopimus Myyntiläus

Suosikki	Pääno Selite	Pääno	Alanro	IsäAlanro	Alarotfhd	Atila	Projekti tila	Ostolasku	Myyntilasku	Tilauspvm	Liikevaihto	Ainekäyttö	Palkat	Kulut Yht.	Kate Eur	Kate %	Liikevaihto budj.	Muut tuotot budj.	Ainekäyttö budj.
<input type="checkbox"/>	LTR-testiprojekti 1	999140	1000	0	1000	3	Valmis	0	0	14.6.2023	30 000,00	887,10	300,00	1 187,10	28 812,90	96,0	55 000,00	0,00	16 900,00
<input type="checkbox"/>	LTR-testiprojekti 1	999140	1001	0	1001	3	Valmis	0	0	14.6.2023	30 000,00	0,00	17,00	17,00	29 983,00	99,9	40 000,00	0,00	0,00

Lisää suosikkeihin Poista suosikeista Päivitä valittujen budjetit L:ään

Visma Real Estate Oy / 9.10.2023 11:41 / Avoin Oy / Pääkäyttäjä / 1426 ms

Projektit Alanimerot Litterat Tapahtumat Asetukset

Budjetit Leikkipöytäkuusi | Tietovarsasto päivitetty 18.5.2024 04:41

Litterat 1-30/38 Kausi (vwwkk)

Projekti 999140 LTR-testiprojekti 1
Alanimerot 1000 Rakennusvaihe A
Lajitus Litterassa (alanro+erittelytyyri) Pilota Littera-riivit
Litterat Litterassa (alanro+erittelytyyri) Pilota O-litterat

Osasto	Budjetit	Ennuste	Lisätyöt	Ennuste jätönsä	Kirjaukset	Kirjaamassa	Toteutunut yht.	Indeksi	Osoittamisessa	Poikkeama	Tunnus
LASKUTUS JA MUUT TUOTOT	65 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	22 000,00	10 000,00	32 000,00	23,9	102 000,00	69 000,00	
Liikevaihto	55 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	22,4	104 000,00	79 000,00	
Ennakoalopetus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	-20 000,00	2 000,00	0,0	-2 000,00	-10 000,00	
Rakennusaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
Avuimet menut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
AINEKÄYTTÖ	16 900,00	41 628,00	5 600,00	47 228,00	483,87	0,00	483,87	1,0	46 744,13	30 328,00	
3010 Avojonot	4 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	102,20	0,00	102,20	1,1	8 997,80	5 000,00	
3020 Puhallusjonot	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,31	0,00	0,31	0,3	2 491,49	0,00	
3040 Tiesuunnitelmajonot	3 500,00	7 100,00	5 600,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	12 700,00	9 200,00	
3060 Voimajonot	6 500,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20 800,00	14 300,00	
3110 Puotustarvikkeet	0,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 328,00	1 328,00	

Projektit Alanimerot Litterat Tapahtumat Asetukset

Tietovarsasto päivitetty 18.5.2024 04:41

Tapahtumat 1-30/512 Kausi (vwwkk)

Rakennusvaihe A

Rakennusvaihe A	Alanimerot	Pvm	Tyyppi	Toteutettu	Koodi	Nimi	h-hinta	Määrä	KP til	KP Tila
999140		31.12.2023								
TARVIK	1001	13.1.2023	001_LIKEVAIHTO		0001	AKKATYO		1,75	300100	0
TARVIK	1001	13.1.2023	001_LIKEVAIHTO		X123	KIERREPALTTI		1,00	3010	0
TARVIK	2188	20.1.2023	001_LIKEVAIHTO		6001	Win Flex		0,10	300100	0
TARVIK	1481	20.1.2023	001_LIKEVAIHTO		PA14024	FRS TUNNUS 2.3		1,00	300602	0
TARVIK	2147	20.1.2023	001_LIKEVAIHTO		6001	Win Flex		3,00	300602	0
TARVIK	2147	20.1.2023	001_LIKEVAIHTO		6001	Win Flex		3,00	300602	0
TARVIK	2147	20.1.2023	001_LIKEVAIHTO		6001	Win Flex		-3,00	300602	0

Projektibudjetointi

- Budjetti ja ennuste voidaan antaa manuaalisesti tai tuoda leikepöydältä
 - Leikepöydällä voidaan hyödyntää esim. tarjouslaskennasta saatuja lukuja
- Litteratason budjetointi - litteroiden nouto Visma L7:sta
- Lisäbudjetit hyödynnettävissä
- Kausikohtaiset ennusteen korjaukset - syöttö estetty lukitulle kaudelle
- Budjetin poisto - toiminto poistaa myös budjetin Visma L7:sta

Kirjatut ja Kirjaamattomat → Porautuminen tapahtumatasolle

Ennuste yht. = Ennuste + Lisätyöt

Poikkeama = Ennuste yht. - Budjetti

Toteutuvat yht. = Kirjatut + Kirjaamattomat

Indeksi = (Toteutuvat yht. / Ennuste yht.) * 100

Odotettavissa = Ennuste yht. - Toteutuvat yht.

Littera	Otsikko	Budjetti	Ennuste	Lisätyöt	Ennuste yhteensä	Poikkeama	Kirjatut	Kirjaamattomat	Toteutuvat yht.	Indeksi	Odotettavissa	Enn. viim. pvm
LASKUTUS JA MUUT TUOTOT												
		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000	0	22 000,00	0,00	22 000	40	33 000	
	Liiketoiminta	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000	0	0,00	0,00	0	0	55 000	6.10.2023
	Ennakkolaskutus	0,00	0,00	0,00	0	0	22 000,00	0,00	22 000	0	-22 000	
	Raholliset tuotot	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	Avoimet maksuerät	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	AINEKÄYTTÖ	16 900,00	17 840,00	5 600,00	23 440	6 540	483,87	0,00	484	2	22 956	6.10.2023
S010	Avoimukset	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000	0	102,20	0,00	102	3	3 898	6.10.2023
S020	Telessemissuunnitelmat	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500	0	8,51	0,00	9	0	2 491	6.10.2023
S040	Asennusohjelmat	3 500,00	3 500,00	5 600,00	9 100	5 600	0,00	0,00	0	0	9 100	26.9.2022
S060	Voimakkaimet	6 500,00	7 000,00	0,00	7 000	500	0,00	0,00	0	0	7 000	6.10.2023
S110	Asennuspalvelut	0,00	440,00	0,00	440	440	0,00	0,00	0	0	440	26.9.2023
S130	Kiinnitystarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
S160	Pinnalliset rasiat	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
S170	Tiliviestitarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	

Projektiseuranta

- Budjetti- ja ennustelukujen kommentointimahdollisuus
- Ennusteiden ja lisäbudjettien muutosloki
- Ennusteiden viimeisin siirto
- Näyttää toteumat (kirjatut ja kirjaamattomat)
- Kaikkien, yksittäisten tai budjetin osien siirto Visma L7:aan samalla kertaa

Projektit Alanimeryt Litterat Tapahtumat Asetukset

Budjetti | Laskutusloki

1-37/37 Käsit (viii) 202311

Projektit: 999143 LTR-testiprojekti 1 | Budjetti: poisto | Päätä budjetit L7:aan

Ala-ennuste: 1000 Rakennusvaihe A | Piilota litterat: ei | Piilota O-litterat: ei

Laskus: Tilinumerot laskutusvaiheisiin

Linja	Oskalo	Budjetti	Ennuste	Lisätyt	Ennuste yhteensä	Prokassa	Kirjatut	Kirjaamattomat	Toteutukset yhte.	Indeksi	Oskaloissa	Enn. välin pvm	Budjetti kom.	Ennuste kom.
LASKUTUS JA MAIUT TUOTOI	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0	22 000,00	0,00	22 000	40	33 000			
Läkevähitys	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0	0,00	0,00	0	0	55 000	6.10.2023		
Ennustekorjaukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0	22 000,00	0,00	22 000	0	-22 000			
Rahoituslaskut	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0			
Avoimet maksut:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0			
AINENKÄYTTÖ	16 800,00	17 800,00	5 600,00	23 440	6 540	403,87	0,00	484	2	22 956	6.10.2023			
5010 Ainehoidot	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000	0	102,30	0,00	102	3	3 898	6.10.2023			
5020 Tekonouskalupelit	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500	0	8,51	0,00	0	0	2 491	6.10.2023			
5040 Aiemuuttolohdot	3 500,00	3 500,00	5 600,00	9 100	5 600	0,00	0,00	0	0	9 100	26.9.2023			
5060 Vuokraukset	6 500,00	7 800,00	0,00	7 800	300	0,00	0,00	0	0	7 900	6.10.2023			
5110 Aiemuuspuut	0,00	440,00	0,00	440	440	0,00	0,00	0	0	440	26.9.2023			joku kommentti jatk...
5130 Kirjalliset välikkeet	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
5160 Pöytäkirjat	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
5170 Tiettyt välikkeet	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
5190 Sivakalusteet	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
5200 Pöytäkirjat	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
5210 Loppukäytöt	400,00	400,00	0,00	400	0	0,00	0,00	0	0	400	6.10.2023			
5240 Pöytäkirjat	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
5250 Sivakalusteet	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
5260 Sivakalusteet	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
5270 Luvut testitietoa	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
Litterainmattomat materiaalikulut	0,00	0,00	0,00	0	375,16	0,00	373	0	373	0	373	6.10.2023		
ALANIMERYT	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000	0	403,23	0,00	403	13	2 597	6.10.2023			
L001 Kuluverot	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000	0	403,23	0,00	403	13	2 597	6.10.2023			
L002 Sivokäytöt	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
Litterainmattomat aihankulut	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
TYÖT	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000	0	305,00	0,00	300	1	29 700	6.10.2023			
T001 Aikaryt	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000	0	300,00	0,00	300	1	9 700	6.10.2023			
T002 Sivokäytöt	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000	0	0,00	0,00	0	0	20 000	6.10.2023			
T003 Kirjatut ja kirjaamattomat	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
Litterainmattomat työt	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
YLEISKUSTANNUKSET	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
X010 Litterat	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
Litterainmattomat yleiskustannukset	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
KAIKIA KUSTANNUKSET	49 800,00	50 800,00	5 600,00	56 440	6 540	1 187,10	0,00	1 187	2	55 253				
KATE EUR	5 100,00	4 100,00	-5 600,00	-1 440	-6 540	20 812,10	0,00	20 812	1 445	-22 258				
KATE %	5,27	7,56	0,00	8	-1	47,30	0,00	47	588	-38				

5050 / Vuokraukset

Kaikki 202311

Oskalo Vuokraukset

Budjetti Vuokraukset

kuusi 2023/10, arvo 6000

Kommentti

Ennuste 7000 | selollinen 2023/10, arvo 6500

Liäbudjetti

Kommentti

lähellä

Muutosloki

tyyppi	Kaikki	Uusi arvo	Vanhassa	Muutos	Muutosloki	Muutosloki	Kommentti	läh
Ennuste	2023/7	7 200	6 500	300	Paikantaja	6.10.2023 10:05		
Ennuste	2023/11	7 800	6 500	300	Paikantaja	6.10.2023 8:59		
Ennuste	2023/10	6 500	6 500	0	Paikantaja	6.10.2023 8:53		
Budjetti	2023/10	6 500	6 500	0	Paikantaja	6.10.2023 8:53		

Räätälöintiä - termistöt ja laskennat

PROJEKTIT

Projektit															Tietovarasto päivitetty 21.5.2024 5:13			admin - administrator	
Projektit															1-5/5 Kausi (vvvvkk)			Näkymä Suosit +	
Suosikki	Pääno	Pääno Selite	Henkilönimi	kokonaislivevaihto	Myyntilaskutus	Kulut yhteensä	Toteutus kate %	Budjetti	Ennuste	Ennustettu Kate %	Valmiusaste	Avoimet maksuerät	Myyntilaskutus budj. yht.	Myyntilaskutus ennuste yht.	Tyyppi	Projektit proj.tila	Kirjaamattomat kulut		
<input type="checkbox"/>	Suosikki	abc%	%																

ALANUMEROT

Alanumerot															Tietovarasto päivitetty 21.5.2024 5:13			admin - administrator	
Alanumerot															1-6/6 Kausi (vvvvkk)			Näkymä Alanumerot +	
Laajuus Yhteensä (alanro + erittelynrot)															Työn tyyppi				
Suosikki	Pääno	Pääno Selite	Henkilönimi	Alanro	A.Selite	Budjetti	Ennuste	Kulut yhteensä	Toteutuneet kulut	Kirjaamattomat kulut	Valmiusaste	Avoimet maksuerät	Myyntilaskutus	A.tilaaja	Ennustettu Kate %	Myyntilaskutus ennuste yht.	Alanro proj.tila		
<input type="checkbox"/>		%																	

LITTERAT

Litterat												Tietovarasto päivitetty 21.5.2024 5:13			admin - administrator		
Litterat												1-131/131 Kausi (vvvvkk)			Näkymä Litterat +		
Projektit												1-131/131 Kausi (vvvvkk)			Näkymä Litterat +		
Laajuus Yhteensä (alanro + erittelynrot)												Työn tyyppi					
Suosikki	Pääno	Pääno Selite	Henkilönimi	Alanro	A.Selite	Budjetti	Ennuste	Kulut yhteensä	Toteutuneet kulut	Kirjaamattomat kulut	Valmiusaste	Avoimet maksuerät	Myyntilaskutus	A.tilaaja	Ennustettu Kate %	Myyntilaskutus ennuste yht.	Alanro proj.tila
<input type="checkbox"/>		%															

Hyödyt käyttäjälle/projektille


Ajantasaisuus

Data päätöksenteon tukena

Käytettävyys



- Termistöt
- Laskennat
- Yksi sovellus, L7 integroituna, selaimessa

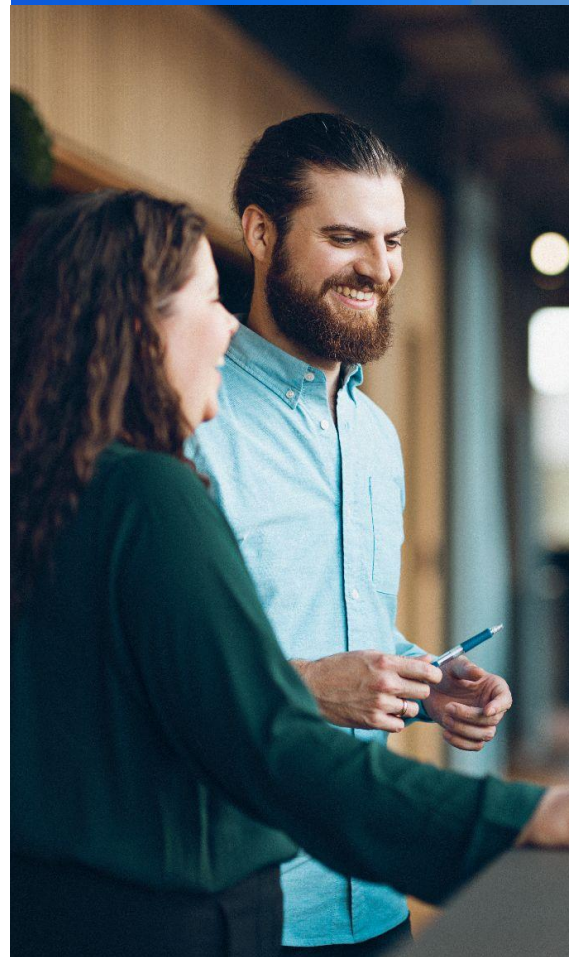

Hyödyt liiketoiminnassa

Tilannekuva - yksi sovellus kokoaa kaiken ajantasaisen tiedon

Ennustettavuus



Elinkaari näkyvyys historiatietoon, muuttujiin ja muutoslokeihin

L7<R REST API mahdollistaa tiedon ulkoiseen raportointiin

Työntekijätyytyväisyys :)



Kiitokset

Entrepreneurial

Responsible

Dedicated

Inclusive

—

Make progress happen

